

FECHA: 25/07/2022

OBRA: Complejo Playa Norte

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE

HORARIO DE OBRA

Lun-Vie: 8 a 16hs

Sab: -

PROYECTO_DE OBRAS TEMPRANA (POT): Obra de Equipamiento Comunitario y Espacio Recreativo.

INFORME QUINCENAL DE OBRA - Semana 11

TRABAJO REALIZADO

Trabajos Pautados según Computo y Presupuestos.

B. OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

B.1 Construcción Equipamiento Comunitario.

B.1.1 Estructura Resistente.

B.1.1.5 Columnas y Vigas de H^oA^o +1.20: **25.78m³** de **136.07m³** un parcial de quincena y un **100m³** de **136.07m³** un acumulado total. *(incluye +1.20 y los datos pertenecen al cambio de proyecto, el nuevo ítem).*

- *Semana 04-08: Colocación de viga perimetral.*
- *Semana 11-15: Colocación de viga perimetral.*
- *Semana 18-22: Colocación de viga perimetral 20x20 y vigas libre 20x50.*
- *Se proyecta terminar para el 25 -29 el armado de las vigas libres, presentarlas en obra y terminar todo lo que es encofrado perimetral y vigas libres; para que el día 01-08 hormigonar.*

B.1.6. Revoques y Revestimientos

B.1.6.1 Exterior Hidrofugo: un **450.2m²** de **450.2m²** un acumulado total.

- *Semana 04-08: Revoque Hidrofugo.*
- *Semana 11-15: Revoque Hidrofugo.*
- *Semana 18-22: Revoque Hidrofugo.*

B.1.6.2 Interior y Exterior Grueso y Fino: **200m²** de **1120.36** un parcial de semanas y un acumulado total. *(incluye solo etapa +1.00 y los datos pertenecen al cambio de proyecto).*

- *Semana 04-08: Revoque Grueso.*
- *Semana 11-15: Revoque Grueso.*
- *Semana 18-22: Revoque Grueso.*

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE

Sab: -

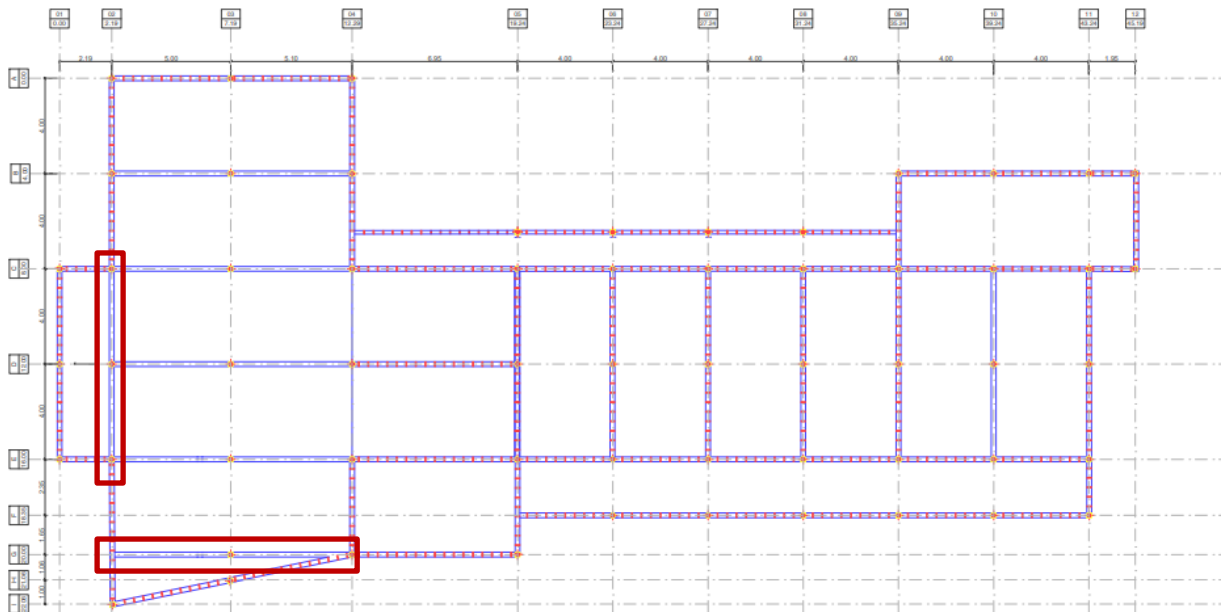
CANTIDAD DE PERSONAL EN OBRA: 20

Cantidad de mujeres trabajando en la obra: 3

Armado de cuadrillas:

- 1- Ayala Juan Antonio
- 2- Duarte Rubén Ernesto
- 3- Encinas Julio Alberto
- 4- Insaurralde Pedro Luis (coordinador de obra)
- 5- Lencina Leónidas Nahuel
- 6- Mendoza Rodrigo Ariel
- 7- Mendoza Víctor Manuel
- 8- Díaz María Soledad (pañolera)
- 9- Fercher Maximiliano (coordinador de obra)
- 10- Morales Juan Rodolfo (sereno)
- 11- Cabrera, Félix Martín
- 12- Gómez, Hugo Oscar Antonio
- 13- Hereñú, Maximiliano Ariel
- 14- Machado, Juan Carlos
- 15- Ramírez, Eduardo Francisco
- 16- Ríos, Celeste Maricel
- 17- Stefano, Luis Marcos Fabian
- 18- Velozo, Víctor Daniel
- 19- Arredondo, Paola Gualdupe
- 20- Cejas, Marcelo Roman

CANTIDAD DE DÍAS DE LLUVIA: 4

PLANOS DE REFERENCIA SECTOR DE AVANCE:

- **Aclaración:** las vigas libres de 20x50 que están marcadas son las que faltan armar y presentarlas en obra. Las demás vigas ya están armadas y presentadas, excepto por las vigas de 20x50 que solo falta presentarlas.

FECHA: 25/07/2022

OBRA: Complejo Playa Norte

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE

HORARIO DE OBRA

Lun-Vie: .8 a 16hs

Sab: -

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO



- Vigas perimetrales de 20x20: son todas las que apoyan sobre el tabique de elevación de Hº.

FECHA: 25/07/2022

OBRA: Complejo Playa Norte

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE

HORARIO DE OBRA

Lun-Vie: 8 a 16hs

Sab: -



FECHA: 25/07/2022

OBRA: Complejo Playa Norte

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE

HORARIO DE OBRA

Lun-Vie: 8 a 16hs

Sab: -

