FECHA: 18/05/2022 HORARIO DE OBRA

OBRA: Complejo Playa Norte Lun-Vie:.8 a 16hs

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE Sab: -

# INFORME QUINCENAL DE OBRA - Semana 05 - Semana 08

# TRABAJOS REALIZADOS

 Trabajos Preliminares de desmalezamiento, limpieza y preparación del terreno. Según CyP 6.692%/ AF 5.69% (aun quedan recortes de vigas al fondo del terreno que deberá ser movido previo a la instalación del lecho nitrificante).

- 2. Colocación de cerco perimetral de obra en malla. Según CyP 0.866%/ AF 0.866%
- 3. Electricidad de construcción. Según CyP 0.099% / IF 0.099%



4. Relleno. Según CyP 3.356% / IF 3.356%. Se dejo mas apto el lugar para trabajar.

FECHA: 18/05/2022 HORARIO DE OBRA OBRA: Complejo Playa Norte

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE

Lun-Vie:.8 a 16hs Sab: -





UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE

Sab: -

5. Movimiento de suelo para fundaciones. Según CyP 3.336% / AF 3.336. se realizó el replanteo en el terreno, haciendo una proyección de la huella del edificio para luego pasar a la etapa del zanjeo. Teniendo en cuenta la cota arbitraria de la calle la trasladamos adentro del cerco en un dado de hormigón para luego transportarla en todos los puntos del replanteo.



FOTO1. Replanteo

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE



FOTO2. Comienzo de zanjeo



FOTO3.

FECHA: 18/05/2022 HORARIO DE OBRA OBRA: Complejo Playa Norte

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE

Lun-Vie:.8 a 16hs



FOTO4. Se llevo a cabo una limpieza del terreno a medida que se zanjeaba.



FOTO5.

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE



FOTO6.



FOTO7.

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE



FOTO8.

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE

Sab: -

6. Estructura Metalica. Según CyP 13.997% / AF 3.5%. (hay que aclarar que en este ítem se encuentra el doblado de armadura para cimientos, columnas y vigas de encadenado de todo el edificio). Para esta primera etapa solo entra cimiento y columnas hasta viga de encadenado +1.40.



7. Capacitación de Higiene y Seguridad. Foto de la segunda clase que llevan los compañeros.



FECHA: 18/05/2022 HORARIO DE OBRA

OBRA: Complejo Playa Norte

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE

Sab: -

Lun-Vie:.8 a 16hs

#### CANTIDAD DE PERSONAL EN OBRA:

Cantidad de mujeres trabajando en la obra: 3

### Armado de cuadrillas:

- 1- Ayala Juan Antonio
- 2- Duarte Rubén Ernesto
- 3- Encinas Julio Alberto
- 4- Insaurralde Pedro Luis (coordinador de obra)
- 5- Lencina Leónidas Nahuel
- 6- Mendoza Rodrigo Ariel7- Mendoza Víctor Manuel
- 8- Diaz María Soledad (pañolera)
- 9- Fercher Maximiliano (coordinador de obra)
- 10- Morales Juan Rodolfo (sereno)
- 11- Cabrera, Felix Martin
- 12- Gomez, Hugo Oscar Antonio
- 13- Hereñu, Maximiliano Ariel
- 14- Machado, Juan Carlos
- 15- Ramirez, Eduardo Francisco
- 16- Rios, Celeste Maricel
- 17- Stefano, Luis Marcos Fabian
- 18- Velozo, Victor Daniel
- 19- Arredondo, Paola Guadalupe
- 20- Cejas, Marcelo Roman

# CANTIDAD DE DÍAS DE LLUVIA.

Solo dos días, de los cuales se fue a laburar igual. Aquel día se llevó un nivel para controlar las profundidades de los zanjeos.




FECHA: 18/05/2022 HORARIO DE OBRA

OBRA: Complejo Playa Norte

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE

Lun-Vie:.8 a 16hs

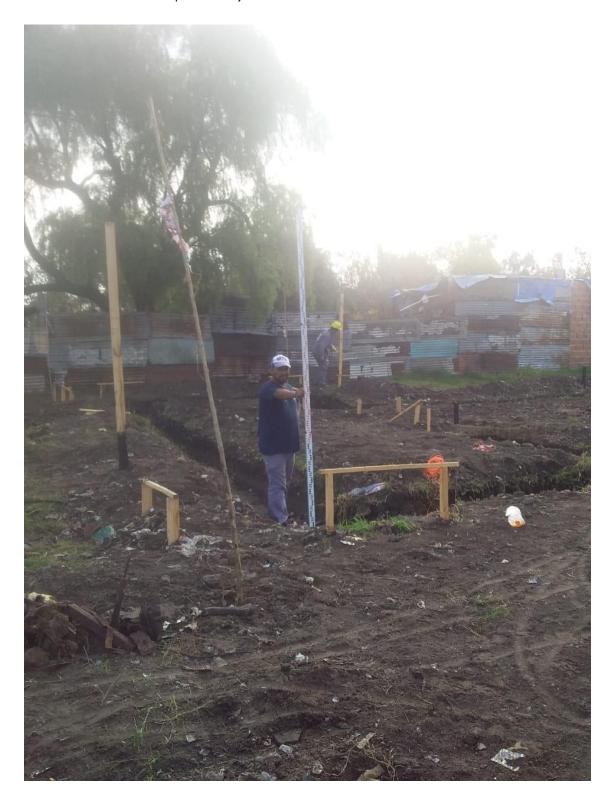

FECHA: 18/05/2022 HORARIO DE OBRA

OBRA: Complejo Playa Norte

UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE

Lun-Vie:.8 a 16hs
Sab: -



UNIDAD EJECUTORA: Coop. De Trabajo MTE Sab: -

**OBSERVACIONES**. Durante el zanjeo se encuentran recortes de vigas.

En una reunión con los vecinos nos comentan que en el lugar de construcción ya se había hecho un pozo años atrás en el cual enterraron basura y recortes de vigas.

